

D4

Improve

مرحلة التحسين

IT Company | DMAIC 6S Project

3

حلول مقترحة رئيسية

CCB

الحل الأول المطبق

أشهر 6

مدة التطبيق


$\leq 10\%$

الهدف المستهدف

اختيار الحلول — Effort vs Impact

التحسين | D4

مصفوفة التأثير والجهد

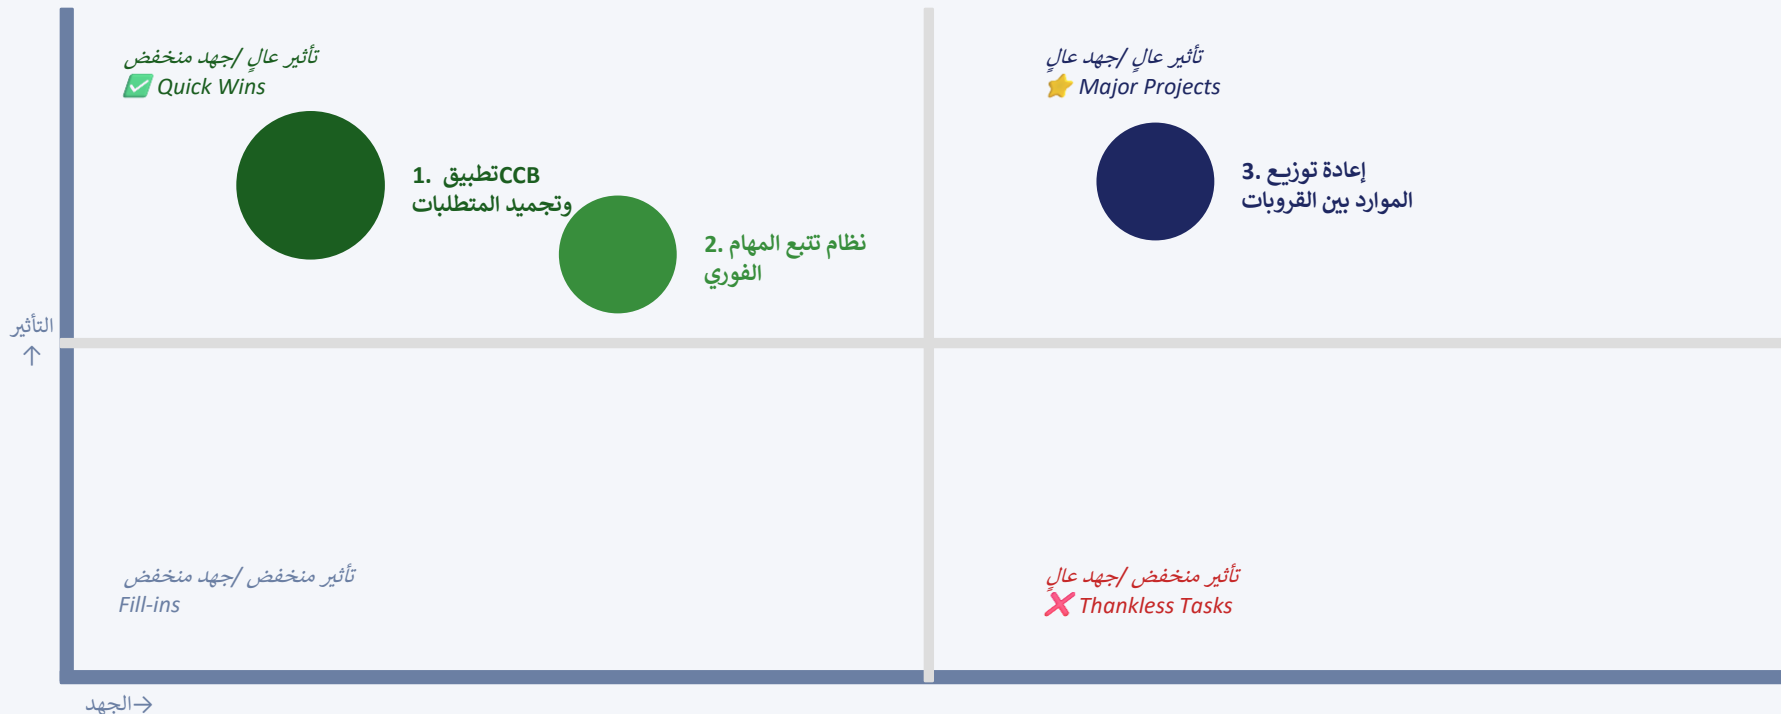

تفصيل الحلول المقترحة

التحسين | D4

01 تطبيق Change Control Board (CCB)

من طلبات التغيير بعد التصميم 45%: السبب الجذري المؤكد: السبب

لا تغيير في تشكيل لجنة رسمية من مدراء القروبات تراجع وتعتمد كل طلب تغيير: الكيف
CCB. المتطلبات بدون موافقة

5% إلى أقل من 45% تقليل طلبات التغيير من

جميع مدراء القروبات

الشهر الأول

02 نظام تتبع المهام الفوري

لا يوجد نظام يوضح المهام المكلفة ويُنَبِّه عند الاقتراب من الموعد: السبب

تقارير. من وقت المهمة 80% تفعيل نظام تتبع يُرسل تنبيهات تلقائية عند تجاوز: الكيف
أسبوعية لكل مدير

اكتشاف التأخر مبكراً قبل وقوعه

GRP-06 DevOps

الشهر الثاني

03 إعادة توزيع الموارد بين القروبات

60% SLA مع أعلى اختراق (ساعة فعلية 568) يحمل أعلى عبء GRP-02 Backend: السبب

في المراحل GRP-02 نقل مهمة أو مطوِّرين من القروبات ذات العبء المنخفض لدعم: الكيف
الحرّة.

20% إلى أقل من 60% من GRP-02 في SLA تقليل اختراق

GRP-02 — سارة خالد

الشهر الثالث

Implementation Plan — خطة التطبيق

التحسين | D4

	الشهر1	الشهر2	الشهر3	الشهر4	الشهر5	الشهر6
وتحديد العملية CCBتشكيل جميع المدراء						
CCBتدريب الفرق على عملية مدراء القروبات						
تفعيل نظام التتبع الفوري GRP-06 DevOps						
(GRP-02)إعادة توزيع الموارد سارة خالد						
Pilot Test — على CCBتطبيق مشروع واحد (QA)فيصل عمر						
مراجعة النتائج وتقييم الأثر جميع المدراء						

النتائج المتوقعة بعد التطبيق

قبل التحسين

نسبة التأخر	33%
طلبات التغيير بعد التصميم	45%
اختراق SLA — GRP-02	60%
اكتشاف التأخر	بعد الوقوع — متأخر
المهام الحرجة غير المكتملة	6 مهام



بعد التحسين

$\leq 10\%$
$\leq 5\%$
$\leq 20\%$
قبل الموعد — مبكر
0 مهام
